




**OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VENTURINA TERME
LOTTO N° 3
VASCA DI LAMINAZIONE**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

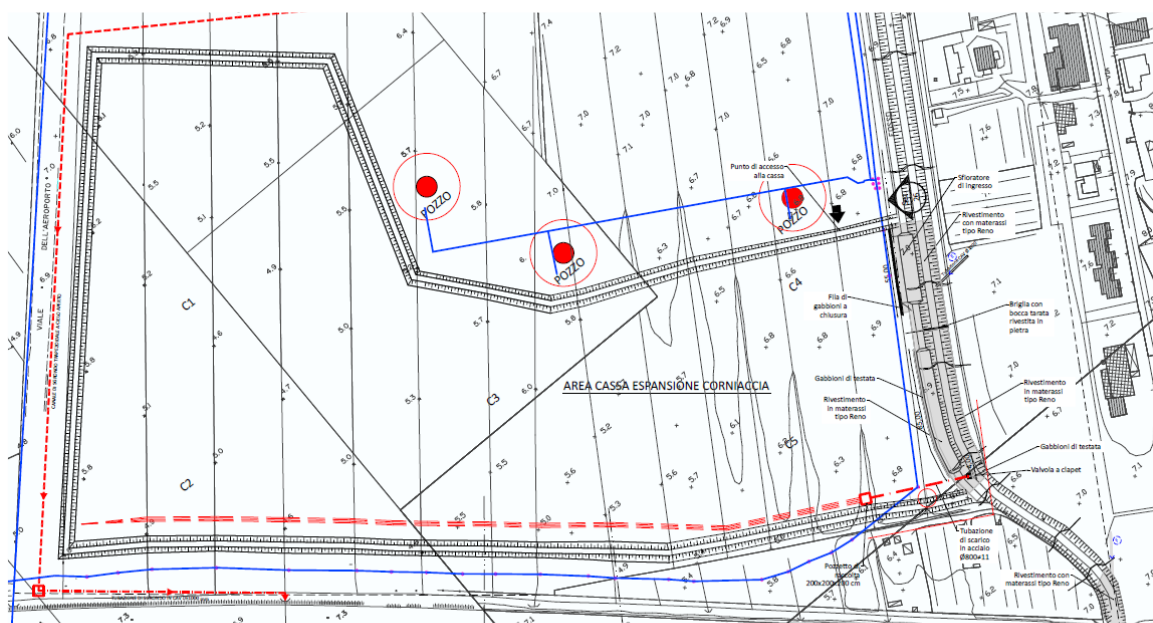

PROGRAMMA DEI LAVORI

Allegato: **A15**

Data: **Febbraio 2017**
Rev. **Maggio 2020**
Rev. **Ottobre 2020**

Ing. Fernando Muccetti
Firmato con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 c.2 D.Lgs 82/2005

PROGRAMMA DEI LAVORI

Lavori di regimazione fosso Corniaccia
Lotto n° 3 Vasca di laminazione

Diagramma di Gantt								
ATTIVITA'	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE
Operazioni preliminari								
<i>Allestimento impianto di cantiere</i>	●●●●							
Opere sulla vasca di laminazione								
<i>Scotico sistemazioni e trasporto a discarica</i>		●●						
<i>Formazione del rilevato arginale</i>		●●●●	●●●●	●●●●				
<i>Riprofilatura degli argini</i>				●●●●	●●●●	●●●●	●	
<i>Opere di rivestimento in pietra</i>					●●●●	●●●●	●●●●	
<i>Opere accessorie di regimazione</i>							●●	
Opere sullo sfioro e sulla briglia								
<i>Scotico e sistemazione dello sfioro</i>		●●						
<i>Fondazione della briglia</i>		●	●					
<i>Esecuzione della briglia</i>			●●●●					
<i>Opere di rivestimento in pietra</i>				●●●●	●●●●	●●●●	●●	
Collaudi								
<i>Collaudo strutture</i>							●	●
<i>Collaudo tecnico amministrativo</i>								●●
