




PROGETTO TRANSFRONTALIERO T.R.I.G. Eau "TRANSFRONTALIERITA', RESILIENZA, INNOVAZIONE E GOVERNANCE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" FINANZIATO DAL PROGRAMMA COMUNITARIO ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. ATTIVITA' T.3.3: REALIZZAZIONE DI INTERVENTO PILOTA – DECULVERTING E MITIGAZIONE DISSESTO DA RISCHIO IDRUALICO DI UN TRATTO DI FOSSO DI SEGAGNANA NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

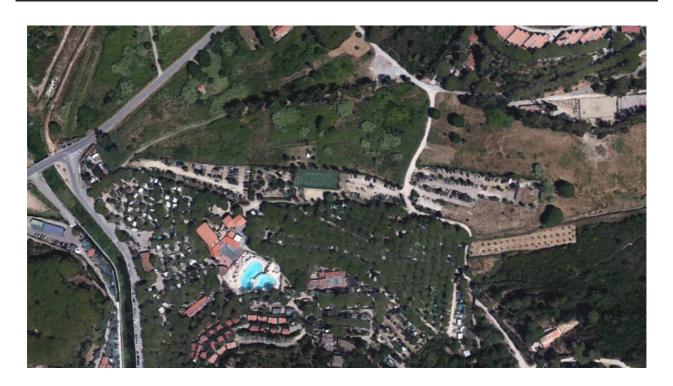

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato 5 - Cronoprogramma

Gruppo di Lavoro

Dott. Ing. Simone Galardini Dott. Ing. Chiara Chiostrini Dott. Geol. Andrea Bizzarri Dott. For. Katuscia Begliomini

Codice 04303	Emesso Galardini	D.R.E.AM. Italia Via Garibaldi, 3 Pratovecchio Stia (Ar) -	
Rev. 00	Controllato Chiostrini	Via Enrico Bindi n.14, Pistoia – Tel 057. http://www.dream-italia.it	3 36.59.67 AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
Data Settembre 2019	Approvato D.T. Miozzo		CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =



													CRO	ONC	PRO)GRA	MMA	A FA	SE 1																									
Yanan Sana		C :		Se	ettim	ana 1			S	ettin	nana :	2			Set	ttiman	ıa 3			Se	ttima	na 4			9	Settim	nana	5			Set	timan	a 6			Set	timar	1a 7			Sett	timana	a 8	
Lavorazione	Importo opere	Giorn	1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	11 12	13	14	15 1	16 17	18	19 20	0 21	22	23 2	4 25	26	27 28	3 29	30	31 3	33	34	35	36 3	7 38	39	40 41	42	43 4	44 45	46	47 48	3 49	50 5	1 52	53 .5	54 55	56
Allestimento cantiere	€ -	2																																										
1.A - Demolizione e scavo corpo stradale	€ 1,416.97	2																																									Ш	
1.A - Posa nuovo attraversamento	€ 4,189.88	3 4																																										
1.A - Posa muri ala e adeguamento sezioni	€ 1,819.36	3																																										
1.A - Ripristino strada	€ 1,038.80	4																																										
1.B - Demolizione e scavo corpo stradale	€ 1,553.98	4																																										
1.B - Posa nuovo attraversamento	€ 4,446.50	4																																										
1.B - Posa muri ala e adeguamento sezioni	€ 1,689.16	5																																										
1.B - Ripristino strada	€ 890.40) 4																																										
1.C - Adeguamento sezioni e rinverdimento	€ 4,247.10	11		1																																	Π						\Box	
1.C - Demolizione tombamento e ripristino	€ 4,247.10	17		1																																	Π						\Box	
1.C - Taglio vegetazione e piante	€ 3,150.38	3 4		1												П																					Π						\Box	
1.C - Demolizioni, rimozioni, gestione interferenze	€ 30,473.12	2 17		1																																	Π						\Box	
1.C - Posa scatolare ed elementi connessi	€ 42,314.99	17		1																																								
1.C - Immissione Galea	€ 6,000.00	5		1																																	П						\Box	
1.C - Ripristini stradali e piazzale	€ 3,374.00	17		1																																	Π						\Box	
1.D - Demolizioni e scavi stradali	€ 14,582.76	18																																										
1.D - Posa condotte di troppopieno	€ 41,434.33	22																																										
1.D - Immissione Galea	€ 6,000.00	3																	ı	ı									ı								\prod							
1.D - Ripristini stradali	€ 8,904.00	5																	Î	ı									Î															
Smobilizzo cantiere	€ -	2																																										

Totale € 181,772.83 90

														CR	ONO	OPR	OGF	RAMI	MA F	ASE	1																									
Lavorazione	Immonto	omono	Cioumi		Set	ttimaı	na 9			S	ettin	nana	10			Se	ttima	na 11	1			Setti	mana	ı 12			Se	ttima	na 13	3			Settir	mana	14			Set	ttima	na 15			Set	ttima	na 16	
Lavoi azione	Importo	opere	GIOLIII	57	58 59	60	61	62 63	64	65	66	67 6	8 69	70	71	72 7	73 74	75	76	77 78	3 79	80	81	82 8	3 84	85	86 8	87 88	89	90 9	91 9	2 93	94	95	6 97	98	99	100 10	01 102	103	104 10	5 106	107 10)8 109	9 110 1	11 112
Allestimento cantiere	€	-	2																																											
1.A - Demolizione e scavo corpo stradale	€ 1,	,416.97	2																																											
1.A - Posa nuovo attraversamento	€ 4,	,189.88	4																																											
1.A - Posa muri ala e adeguamento sezioni	€ 1,	,819.36	3																																											
1.A - Ripristino strada	€ 1,	,038.80	4																																											
1.B - Demolizione e scavo corpo stradale	€ 1,	,553.98	4																																											
1.B - Posa nuovo attraversamento	€ 4,	,446.50	4																																											
1.B - Posa muri ala e adeguamento sezioni	€ 1,	,689.16	5																																											
1.B - Ripristino strada	€	890.40	4																																											
1.C - Adeguamento sezioni e rinverdimento	€ 4,	,247.10	11																																											
1.C - Demolizione tombamento e ripristino	€ 4,	,247.10	17																																											
1.C - Taglio vegetazione e piante	€ 3,	,150.38	4																																											
1.C - Demolizioni, rimozioni, gestione interferenze	€ 30	,473.12	17																																											
1.C - Posa scatolare ed elementi connessi	€ 42	,314.99	17																																											
1.C - Immissione Galea	€ 6,	,000.00	5																																											
1.C - Ripristini stradali e piazzale	€ 3,	374.00	17																																											
1.D - Demolizioni e scavi stradali	€ 14,	582.76	18																																											
1.D - Posa condotte di troppopieno	€ 41,	434.33	22																																											
1.D - Immissione Galea	€ 6,	,000.00	3																																											
1.D - Ripristini stradali	€ 8,	904.00	5																																									1		
Smobilizzo cantiere			2																																Ì											

Totale € 181,772.83 90

												CRC	ONC	PRC	GRA	MM	A FA	SE 2	2																										
Lavarazione	Immonto onono	Ciann		Setti	mana	1		S	Settir	mana	2			Set	timan	ıa 3			S	ettima	ana 4			(Settin	nana	5			Set	ttima	ana (ó			S	ettim	ana 7				Se	ettima	ana 8	ļ
Lavorazione	Importo opere	Giorn	1 1 2	2 3	4 5	6	7 8	9	10	11 13	2 13	14	15 1	16 17	18	19 2	0 21	22	23	24 25	26	27 2	8 29	30	31 3	33	34	35	36 3	38	39	40	41	42	43	44	15 46	6 47	48	49	50 5	51 57	2 53	3 54	55 56
Allestimento cantiere	€ -	2																																П											
Demolizione e scavo strada	€ 10,954.90	6																																										T	
Posa condotte alimentazione cassa espansione	€ 34,517.63	15																																											
Ripristini stradali	€ 3,710.00	5																																П											
Taglio vegetazione	€ 1,712.93	3																																П											
Scotico e sbancamento cassa espansione	€ 48,120.00	40																																											
Formazione rilevati arginali e rinterri	€ 33,215.50	40																																											
Scarico cassa	€ 3,040.00	3																																П											
Scogliera sfioratori e protezione alla base	€ 20,000.00	24																																											
Opere a verde	€ 4,897.90	5																																П											
Smobilizzo cantiere		2																																ıT											

Totale € 160,168.86 90

														CRO	NOF	PRO	GRA	MM/	A FA	SE 2																										
Lavavariana	I	outo onono	Cionni		Sett	timan	ıa 9			Se	ttima	na 10	0			Setti	mana	11			Set	tima	na 12			S	ettim	ana í	13			Set	ttima	na 1	4			Sett	timar	na 15			Se	ettima	ana 1	6
Lavorazione	Imp	orto opere	GIOTIII	57 5	58 59	60	61 6	63	64	65 6	6 67	68	69	70 7	1 72	73	74 7	75 70	5 77	78	79 80	81	82	83 8	84 85	86	87 8	88 89	90	91	92	93 94	4 95	96	97	98	99 1	00 10	1 102	103 1	.04 10	05 106	107	108 10	9 110	111 112
Allestimento cantiere	€	-	2																																											
Demolizione e scavo strada	€	10,954.90	6																																											
Posa condotte alimentazione cassa espansione	€	34,517.63	15																																											
Ripristini stradali	€	3,710.00	5																																											
Taglio vegetazione	€	1,712.93	3																																											
Scotico e sbancamento cassa espansione	€	48,120.00	40																																											
Formazione rilevati arginali e rinterri	€	33,215.50	40																																											
Scarico cassa	€	3,040.00	3																																											
Scogliera sfioratori e protezione alla base	€	20,000.00	24																																											
Opere a verde	€	4,897.90	5																																											
Smobilizzo cantiere			2																																											

Totale € 160,168.86 90
